



REPORTE AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

08/08/2022

 INDICA MARCAS VECINAS
 INDICA ESPACIO DESIGNADO A AERIE
 INDICA PASILLO PRINCIPAL

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO SE ENCONTRO MOBILIARIO BUELTO DE MARCA THAT'S IT, SE DEBERA DE CONTEMPLAR.

RETRO DE MOBILIARIO CENTRAL Y PERIFERIAL, SE DEBERA DE VERIFICAR CON EL AREA DE MANTENIMIENTO LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RETIRADO.

NO HAY CREPALLERAS EN PERIMETRO, **CONSIDERAR EN PRESUPUESTO**

SE ENCONTRO PISO EXISTENTE EN TIENDA, NO SE CONSIDERA CAMBIO DE PISO, PISO VINILICO COLOR VERDE OLIVO. DE 480 x 480 mm.

ZOGLCO: DE 20 mm x 100 mm DE MDF COLOR CAFE.


MARCAS COLINDANTES: ACCESORIOS Y GENERICA.

AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO, SE ENCONTRO UN REGISTRO EN FLAPON, NO SE ENCONTRARON CONTACTOS, **CONSIDERAR EN PRESUPUESTO.**


JEFE DE MANTENIMIENTO: FELIPE GOMEZ

SUBJEFE DE MANTENIMIENTO: AZAEL OLIVOS

ASESOR DE MAGEN: BERGIO MARTINEZ

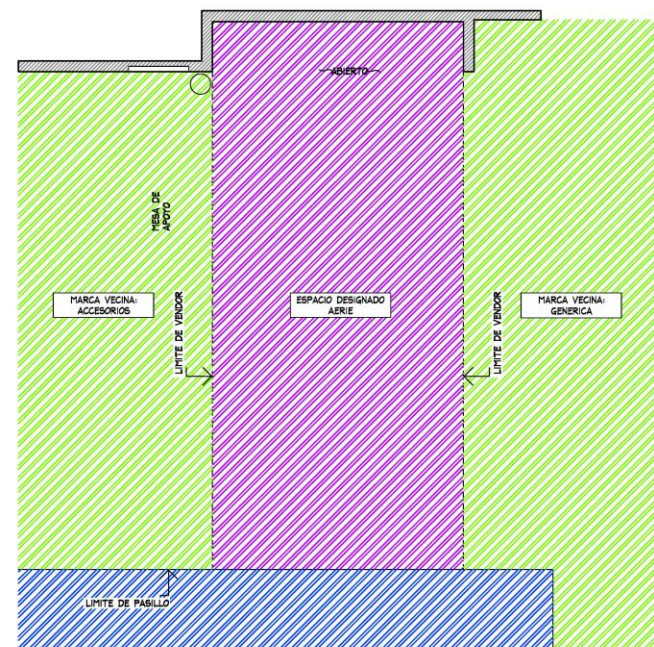

PLANTA GENERAL
ESC. 1:50

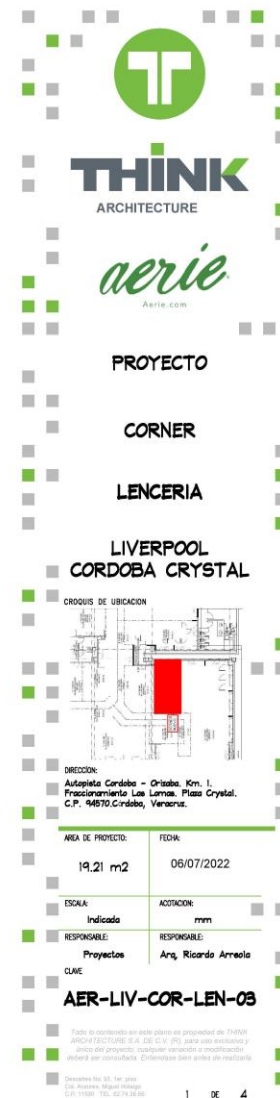

REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL





TABLA DE MOBILIARIO LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL		
CLAVE	DESCRIPCION	Nº MUEBLES
AER-DIS-WALL-1220	DISPLAY WALL	2
MKT-TRY-48-1220	SHELF PULL OUT TRAY	4
MKT-SHELF-1220	WALL CASE SHELF	4
AE-BOX-DIS-1220	BOX -DISPLAY WALL	2
RH12S-WHT FACEOUT W	FRONTAL	28
GR1-WHT-SADDLE HANGRAIL BRKT1"	BRACKET PARA BARRA	20
RT4-WTG HANGRAIL BAR 48"-1220	BARRA TINTORERIA	10
AERIE-FLOWER-STAND-NEW	AERIE FLOWER	1
MKT-RT-7236	RECTANGLE PICNIC TABLE	1
MKT-BENCH-481820	GARDEN BENCH W/DRAWER	2
MKT-2WAY-391857	2WAY GALVANIZED WARDROBER	2
CON-T-RACK-3-5-20	T-RACK	2
FIT GUIDE	GRAFICO TOTEM	1
AER-MAR-DIS-02	MARQUEE	1
MANIQUE	MANIQUE	1
MKT-BFBF	BASE MANIQUE	1
TOTAL EN CORNER		82

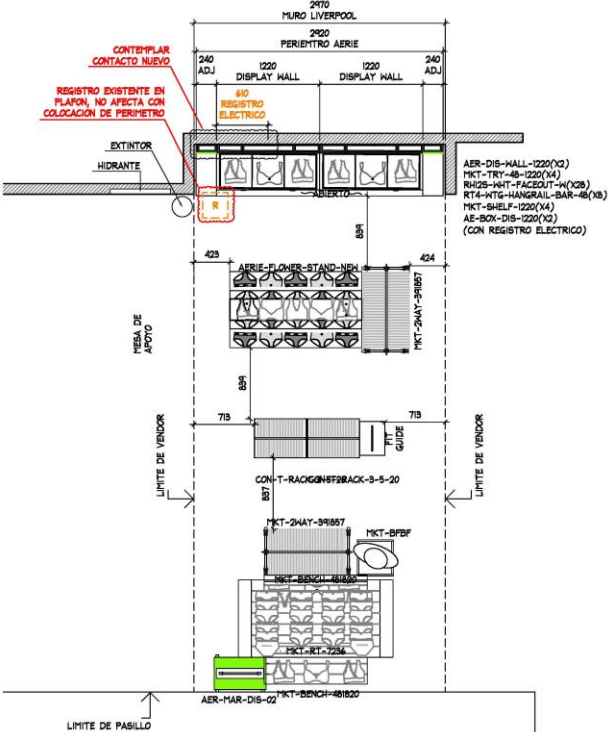

PLANTA ARQUITECTONICA
ESC. 1:50

THINK
ARCHITECTURE

aerie
Aerie.com

PROYECTO

CORNER

LENCERIA

LIVERPOOL
CORDOBA CRYSTAL

CROQUIS DE UBICACION

DIRECCION:
Autopista Córdoba - Orizaba, Km. 1,
Fraccionamiento Las Lomas, Plaza Crystal,
C.P. 94670 Córdoba, Veracruz.

AREA DE PROYECTO:	FEDIA:
19,21 m2	06/07/2022

ESCALA:	ACOTACION:
Indicada	mm

RESPONSABLE:	PROYECTOS:
Arg. Ricardo Arreola	

CLAVE

AER-LIV-COR-LEN-03


Todos los contenidos en este plano son propiedad de THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V. (S) para uso exclusivo y dentro del proyecto. Cualquier uso no autorizado o modificación deberá ser comunicada. Confidencialidad antes de su realización.

Diciembre del 2022, No. 03, No. 0000
Calle Reforma, 100, 94670 Córdoba, Veracruz
C.P. 94670 Córdoba, Veracruz

2 DE 4



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

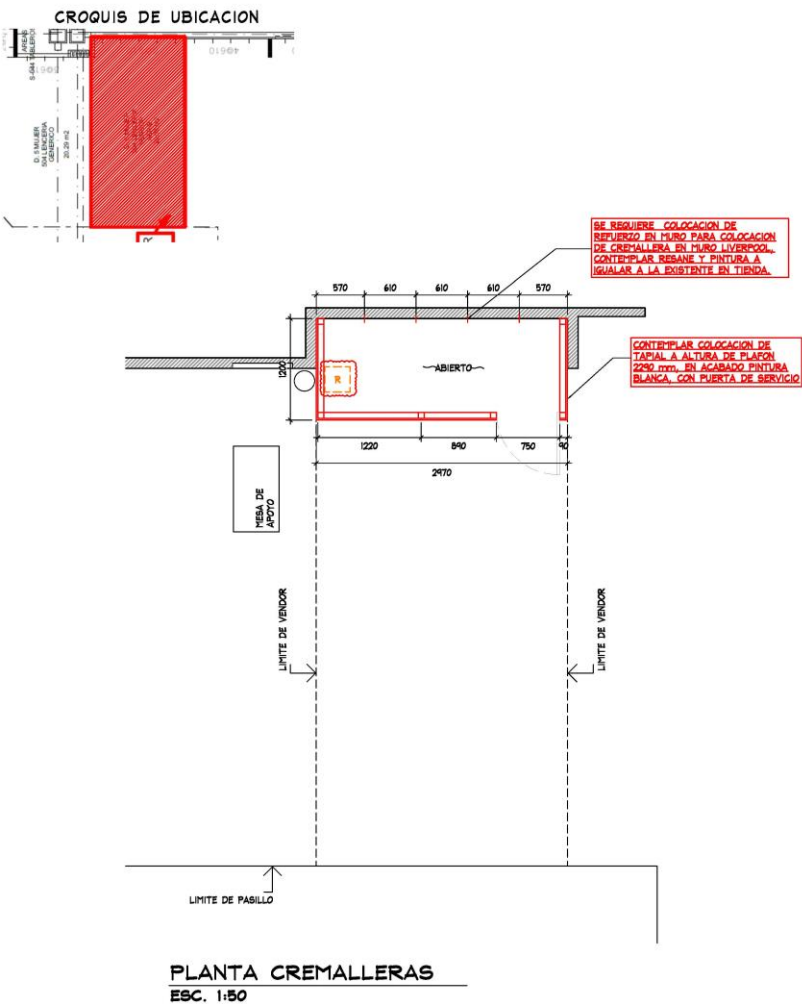

ESTADO ACTUAL

THINK
ARCHITECTURE

aerie
Aerie.com

PROYECTO

CORNER

LENCERIA

LIVERPOOL
CORDOBA CRYSTAL

CROQUIS DE UBICACION

DIRECCION:
Autopista Córdoba - Orizaba, Km. 1,
Fraccionamiento Las Lomas, Plaza Crystal,
C.P. 94570 Córdoba, Veracruz.

AREA DE PROYECTO:	FECHA:
19.21 m ²	06/07/2022

ESCALA:	ACOTACION:
Indicada	mm

RESPONSABLE:	RESPONSABLE:
Proyectos	Arg. Ricardo Arreola

CLAVE

AER-LIV-COR-LEN-03

Todos los contenidos en este plano son propiedad de THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V. para uso exclusivo y control del proyecto. Cualquier uso no autorizado deberá ser consultado. Entendidos los datos de medición.

Disenado por: [Nombre]
Dibujado por: [Nombre]
C.P. 94570 Córdoba, Veracruz.

3 DE 4



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

INGRESO Y DESCARGA DE
MATERIALES EN ÁREA
DESIGNADA POR PREVENCIÓN.



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

INGRESO Y DESCARGA DE
MATERIALES EN ÁREA
DESIGNADA POR PREVENCIÓN.



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

INGRESO Y DESCARGA DE
MATERIALES EN ÁREA
DESIGNADA POR PREVENCIÓN.



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

INGRESO Y DESCARGA DE
MATERIALES EN ÁREA
DESIGNADA POR PREVENCIÓN.



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

Colocación de Cargadores.

**Anclaje de cargadores en
Canaletas ubicadas 250mm lado
izquierdo y a 295mm lado derecho,
a 610mm a partir de cualquiera de
esos puntos de referencia.**



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

Ubicación de canaletas.

**Anclaje de cargadores en
Canaletas ubicadas 250mm lado
izquierdo y a 295mm lado derecho,
a 610mm a partir de cualquiera de
esos puntos de referencia.**



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL

Colocación de perímetro.



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL



REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL




REPORTE INSTALACIÓN AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL




THINK
ARCHITECTURE

• PROYECTO AERIE LIVERPOOL CORDOBA CRYSTAL	• Fecha: 08 de Agosto de 2022
--	---


Lista de entregables	Canti dad	Comentarios
• TRABAJOS REALIZADOS		
• Suministro e instalación AER-DIS-WALL-1220	2	Pza.
• Suministro e instalación MKT-TRY-48-1220	4	Pza.
• Suministro e instalación MTK-SHELF-1220	4	Pza.
• Suministro e instalación AE-BOX-DISC-1220	2	Pza.
• Suministro e instalación RH125-WHT FACEOUT W	28	Pza.
• Suministro e instalación GR1-WHT-SANDLE HANGRAIL-BRKT1	20	Pza.
• Suministro e instalación RT4-WTG HANGRAIL BAR 48"-1220	10	Pza.
• Suministro e instalación ARIE FLOWER STAND NEW	1	Pza.
• Suministro e instalación MKT-RT-7236	1	Pza.
• Suministro e instalación MKT-BENCH-481820	2	Pza.
• Suministro e instalación MKT-2WAY-391857	2	Pza.
• Suministro e instalación CON-T-RACK-3-5-20	2	Pza.
• Suministro e instalación FIT GUIDE	1	Pza.
• Suministro e instalación AER-MAR-DIS-02	1	Pza.
• Suministro e instalación MANIQUE 	1	Pza.
• Suministro e instalación MKT-BFBF	1	Pza.
Comentarios		Firma
Revision de acabado en cubierta de mesa rectangular.		



Ing. B. Alan Quiroz R.
Entrego
(Nombre y Firma)



Arq. Uriel Vara
Recibió
(Nombre y Firma)



Ing. Abraham N. del Olivo del Valle



Visualizando ideas. Excediendo expectativas.



thethinkarchitecture.com
